

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie**
Nadzór Wodny w Nakle
ul. Hallera 23A
89-100 Nakło nad Notecią

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA
TERENIE
NADZORU WODNEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ
NA OBSZARACH POWIATÓW: BYDGOSKIEGO,
SĘPOLEŃSKIEGO, NAKIELSKIEGO, CZŁUCHOWSKIEGO,
PILSKIEGO, ZŁOTOWSKIEGO
ZA ROK 2025**

Spis treści:

- 1. Podstawa prawna sprawozdania.**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.**

1. Podstawa prawna sprawozdania.


W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.) przedstawiam Radzie Powiatu (Miasta) roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2024, na terenie powiatów: nakielskiego, bydgoskiego, pilskiego, sępoleńskiego, złotowskiego i człuchowskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu, Nadzór Wodny w Nakle nad Notecią.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- m) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- n) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Bydgoszczy obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat nakielski, a także część powiatów bydgoskiego, sępoleńskiego, człuchowskiego, pilskiego, złotowskiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW Nakło wynosi 1245,79 km². Długość cieków administrowanych przez NW Nakło wynosi 395,19 km. Na terenie NW Nakło znajduje się 21 budowli piętrzących.

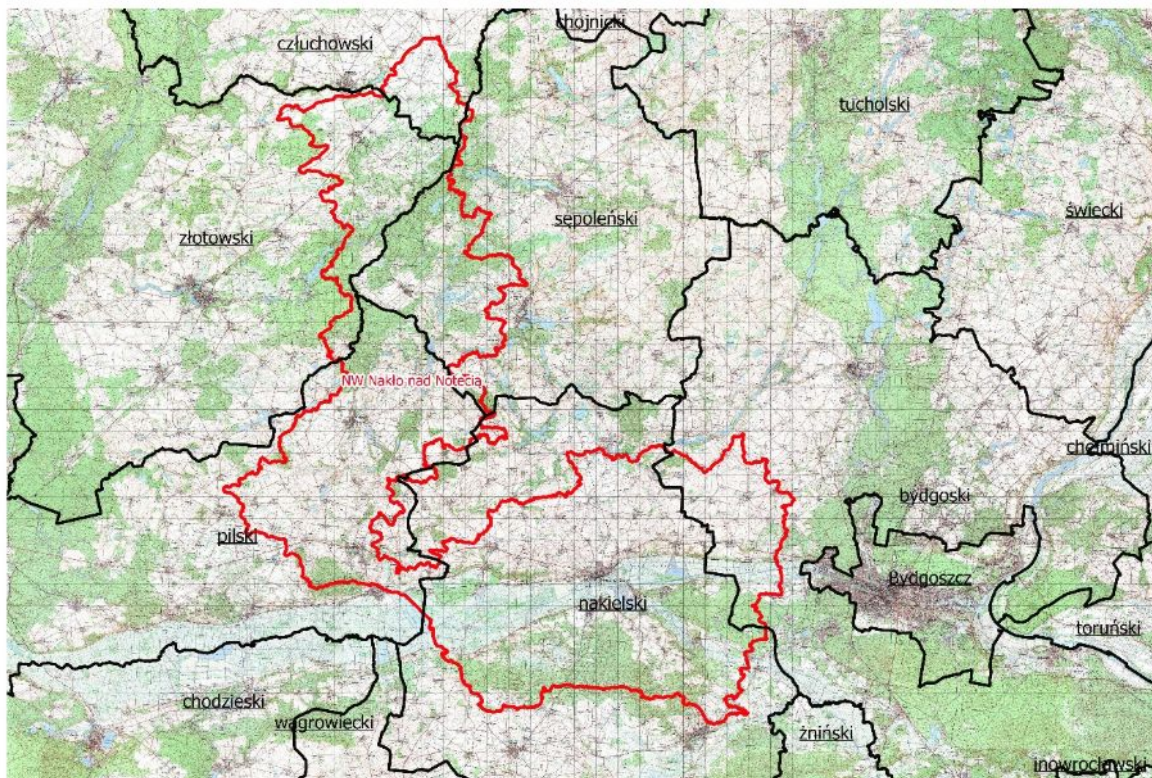

3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Inowrocławiu	Nakło	nakielski	Szubin
			Nakło nad Notecią
			Mrocza
			Kcynia
			Sadki
		bydgoski	Sicienko
		pilski	Wyrzysk
			Białośliwie
			Wysoka
			Łobżenica
		sępoleński	Więcbork
			Sępólno Krajeńskie
			Kamień Krajeński

		złotowski	Złotów
			Zakrzewo
			Lipka
		człuchowski	Debrzno
			Człuchów

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW Nakło.

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1	Sadki, Nakło nad Notecią, Mrocza	Rokitka	Ręczne wykoszenia porostów ze skarp i dna wraz z wygrabieniem, nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami, usuwanie zatorów na długości 26,717 km	149 931,80 zł
2	Wyrzysk, Lipka	Łobzonka - remont budowli w km 20+970 i km 77+585	Umocnienie skarpy prawej poniżej jazu w Klawku w km 20+970, umocnienie skarp powyżej zastawki w Czyżkówku w km 77+585	114 939,00 zł
3	Więcbork	Struga Zgniłka	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna wraz z wygrabieniem, hakowanie dna, usunięcie zatorów oraz wywrotów z dna oraz skarp cieku z złożeniem na koronę skarpy oraz na całej długości prowadzonej konserwacji, ścinanie krzaków rosnących w korycie oraz gałęzi zwisających do koryta cieku na całej długości prowadzonej konserwacji, mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 22,5 cm, nadzór przyrodniczy nad realizacją prac na długości 3,895 km	28 651,89 zł
4	Nakło nad Notecią, Sicienko	Struga Śleska	Ręczne wykoszenia porostów ze skarp i dna wraz z wygrabieniem, nadzór przyrodniczy nad realizacją prac na długości 7,484 km	25 038,98 zł
5	Kcynia	Kanał Dębogórski	Ręczne wykoszenia porostów ze skarp i dna wraz z wygrabieniem, usunięcie zatorów oraz wywrotów z dna oraz skarp cieku, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy, ścinanie krzaków rosnących w korycie oraz gałęzi zwisających do koryta cieku na całej długości prowadzonej konserwacji, mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 22,5 cm, nadzór przyrodniczy nad realizacją prac na długości 6,840 km	33 964,65 zł
6	Wyrzysk, Łobżenica, Więcbork,	Łobzonka	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna cieków wraz z wygrabieniem, mechaniczne hakowanie dna cieków wraz z rozplantowaniem, ręczne wykoszenie	94 058,50 zł

	Lipka, Debrzno		porostów gęstych twardych ze skarp i dna cieków wraz z wygrabieniem, nadzór przyrodniczy nad realizacją prac na długości 16,424 km	
7	Sadki	Rokitka – remont umocnień zastawki w km 5+506	Remont umocnień zastawki w km 5+506	50 741,77 zł
8	Mrocza	Rokitka – remont umocnień zastawki w km 32+059	Remont umocnień zastawki w km 32+059	89 956,84 zł
9	Więcbork	Struga Lubcza	Ręczne wykoszenia porostów ze skarp i dna wraz z wygrabieniem, hakowanie dna, ścinanie krzaków rosnących w korycie oraz gałęzi zwisających do koryta cieku na całej długości prowadzonej konserwacji, mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 22,5 cm, koszenie dna wlotów i wylotów z jezior, usunięcie zatorów oraz wywrotów z dna oraz skarp, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy, nadzór przyrodniczy nad realizacją prac na długości 11,665 km	55 563,83 zł
10	Lipka, Debrzno	Stołunia	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna wraz z wygrabieniem, usunięcie zatorów oraz wywrotów z dna oraz skarp cieku z złożeniem na koronę skarpy, ścinanie krzaków rosnących w korycie oraz gałęzi zwisających do koryta cieku na całej długości prowadzonej konserwacji, mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 22,5 cm, nadzór przyrodniczy nad realizacją prac na długości 13,596 km	68 948,24 zł
11	Lipka, Debrzno	Stołunia – remont budowli w km 21+547, 21+904, 23+014	Remont zastawki w km 21+547 Remont zastawki w km 21+904 Remont zastawki w km 23+014	94 647,42 zł
12	Nakło nad Notecią, Sicienko	Kanał Ślesiński	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna wraz z wygrabieniem, mechaniczne hakowanie dna wraz z rozplantowaniem, usuwanie zatorów, nadzór przyrodniczy nad realizacją prac na długości 7,888 km	45 232,15 zł
13	Więcbork, Sępólno Kraj.	Kanał Jeleń	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna wraz z wygrabieniem, hakowanie dna, usunięcie zatorów oraz wywrotów z dna oraz skarp cieku z złożeniem na koronę skarpy, ścinanie krzaków rosnących w korycie cieku oraz gałęzi zwisających do koryta cieku na całej długości prowadzonej konserwacji, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów p o średnicy do 22,5 cm, nadzór	66 179,05 zł

			przyrodniczy nad realizacją prac na długości 13,296 km	
14	Kcynia	Kanał Nowowiejski	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna wraz z wygrabieniem, mechaniczne hakowanie roślinności korzeniącej się dnem wraz z rozplantowaniem, nadzór przyrodniczy nad realizacją prac na długości 3,450 km	41 279,40 zł
15	Więcbork, Sępólno Kraj.	Kanał Jeleń – remont budowli	Remont zastawki w km 0+012 Remont zastawki w km 1+542 Remont zastawki w km 5+454 Remont zastawki w km 9+890	28 928,53 zł
16	Wyrzysk, Wysoka	Kanał Młotkowski	Usuwanie zatorów, ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna wraz z wygrabieniem, hakowanie dna, ręczne ścinanie krzaków rosnących w korycie oraz gałęzi zwisających do koryta cieku na całej długości prowadzonej konserwacji, mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 22,5 cm na długości 16,590 km, oczyszczenie studzienek drenarskich z namotu	97 485,97 zł
17	Szubin	Stara Noteć Rynarzewska	Roboty konserwacyjne: ręczne wykoszenie porostów ze skarp wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrabnianie gałęzi. Kanał ulgi przy jazie Tur: ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna wraz z wygrabieniem. Naprawa grobli: usuwanie zapadlisk i nierówności grobli przy użyciu koparki gąsienicowej, rozplantowanie urobku pobranego z dna w celu wyrównania korony grobli, nadzór przyrodniczy nad realizacją prac na długości 3,840 km	145 184,69 zł
18	Wysoka	Remont zastawki Czajcze 2 na Kanale Młotkowskim w km 15+800	Remont zastawki w km 15+800	34 999,99 zł
19	Sadki, Wyrzysk, Łobżenica	Wycinka drzew i krzewów, usuwanie zatorów, diagnostyka drzew na terenie ZZ Inowrocław – Obiekt NW Nakło	Wycinka i ogłowienie 27 szt. drzew	43 917,23 zł
ŁĄCZNIE:				1 309 649,93 zł

5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny.

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. Dz. U. 2023 poz. 1478 ze zm.

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	30	93
II	35	94
III	28	84
IV	26	90
ROCZNIE	119	361

**KIEROWNIK Nadzoru
Wodnego w Nakle nad Notecią
Wojciech Skwierawski
/podpis elektroniczny/**
